

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	下田市における汚水処理整備の推進												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	下田市												
計画の目標	下田市下水道事業計画区域内の汚水処理整備を行い下水道の普及を図ることで、市民の安全・快適な生活環境の維持・向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	111	A	104	B	0	C	7	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	6.3	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H29末)
1	下水道処理人口普及率の達成率を45.4%(H27)から47.5%(H29)に増加。 下水道処理人口普及率 {下水道処理人口(人)/行政人口(人)}×100	45%	47%	48%
2	下水道水洗化率を69.4%(H27)から70.5%(H29)に増加。 下水道水洗化率 {下水道接続人口(人)/行政人口(人)}×100	69%	70%	71%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	下田市	直接	下田市	管渠(汚水)	新設	下田処理区管渠整備(汚水管)(未普及解消)	汚水管 200mm L=450m 75m m(圧送) L=152m マンホールポンプ1基	下田市						88		-	
	A07-002	下水道	一般	下田市	直接	下田市	-	-	アクションプラン策定業務	計画策定一式	下田市						2		-	
	A07-003	下水道	一般	下田市	直接	下田市	-	-	事業計画変更業務	事業計画の見直し	下田市						14		-	
												小計						104		
												合計						104		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	C07-001	下水道	一般	下田市	間接	下田市	-	-	下水道接続助成金の交付	下水道接続助成金の交付	下田市						7	-		
		供用開始後1年以内の下水道切替工事（新築・法人等は除く）に対して上限7万円/件を助成し、下水道普及促進を図る。																		
											小計						7			
											合計						7			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

下田市担当部局で事業に対する審査、評価を実施。

事後評価の実施時期

平成30年11月

公表の方法

評価完了後、市のホームページへ掲載。

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

未普及箇所の下水道管渠整備により、6.35haを整備・供用開始し、生活環境の向上を図ることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）


特記事項（今後の方針等）

今後は、事業計画及びアクションプランに基づき、計画区域内の公共下水道整備早期概成を図りたい。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	指標（下水道処理人口普及率）	
	最終目標値	48%
	最終実績値	48%
2	指標（下水道水洗化率）	
	最終目標値	71%
	最終実績値	71%

(参考様式6) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	下田市における汚水処理整備の推進 (第3回変更)	交付対象	下田市
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)		

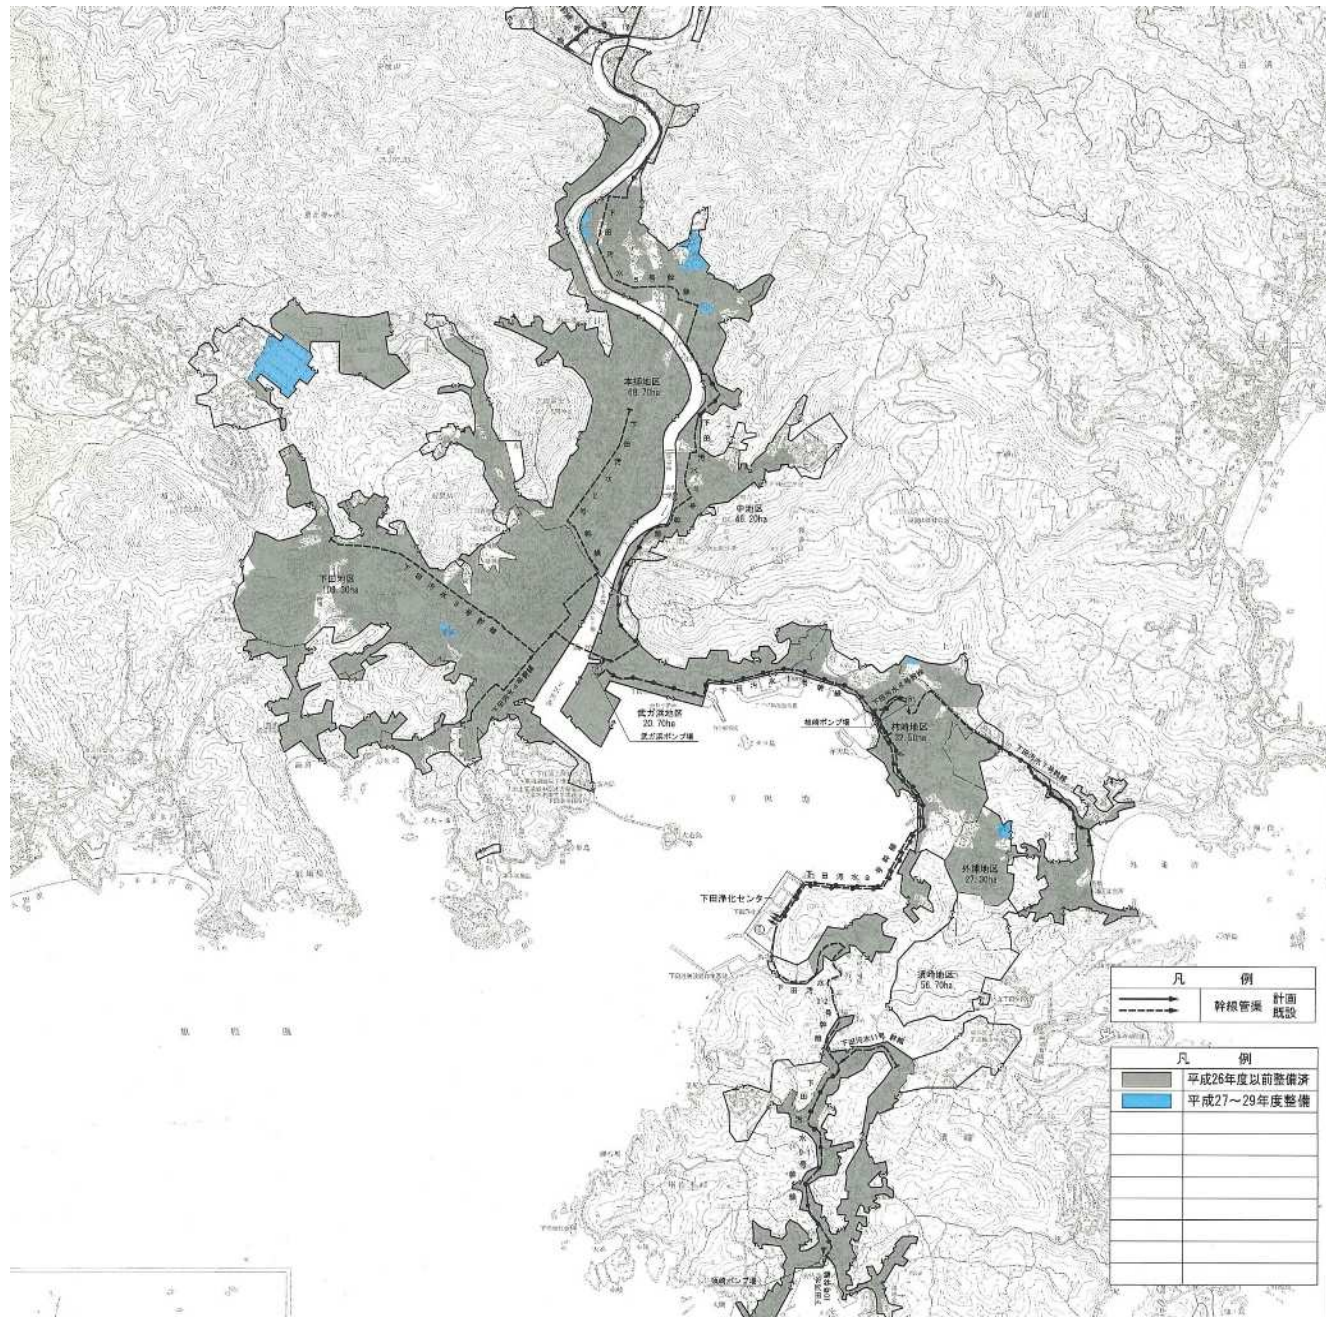

A07-001下田処理区管渠整備(污水管)(未普及解消)

A07-002アクションプラン策定業務

A07-003事業計画変更業務

C07-001下水道接続助成金の交付
